



COMUNE DI FOLIGNO


REGIONE UMBRIA



PROGETTO ESECUTIVO

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARI
TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2022 - LOTTO 4**

RIFACIMENTO DEL CANALE SOTTERRANEO DI VIA P. GORI - CUP C67H22002020004















CIVICO 8.TECH

COMUNE DI FOLIGNO R.U.P. Ing. Francesco Maria Castellani		ALLEGATO	S.05
OGGETTO	CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI		DATA Dicembre 2022
	FILE 02_Mascherine.dwg	ARCHIVIO Civico 8.tech	SCALA Arch. Margherita Bececco

Progettista, Direttore dei Lavori e
Coordinatore della Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione
Ing. Andrea Galli

Via Maestà di Donati, 26 - 06034 Foligno (PG)
Tel 335/6525861 - a.galli@civico8.tech
andrea.galli3@ingpec.eu

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecesso					03 apr 23				10 apr 23				17 apr 23				24 apr 23							
						G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G		
1	 Interventi di Manutenzione Straordinaria su vari tratti di strada	55 g	ven 31/03/23	gio 15/06/23																									
2	 Impostazione Cantiere	1 g	ven 31/03/23	ven 31/03/23																									
3	Fase 1	13 g	lun 03/04/23	mer 19/04/23																									
4	fresatura	3 g	lun 03/04/23	mer 05/04/23	2																								
5	demolizione soletta	3 g	gio 06/04/23	lun 10/04/23	4																								
6	nuova soletta CA	5 g	mar 11/04/23	lun 17/04/23	5																								
7	nuova pavimentazione stradale	2 g	mar 18/04/23	mer 19/04/23	6																								
8	Fase 2	13 g	gio 20/04/23	lun 08/05/23																									
9	fresatura	3 g	gio 20/04/23	lun 24/04/23	7																								
10	demolizione soletta	3 g	mar 25/04/23	gio 27/04/23	9																								
11	nuova soletta CA	5 g	ven 28/04/23	gio 04/05/23	10																								
12	nuova pavimentazione stradale	2 g	ven 05/05/23	lun 08/05/23	11																								
13	Fase 3	13 g	mar 09/05/23	gio 25/05/23																									
14	fresatura	3 g	mar 09/05/23	gio 11/05/23	12																								
15	demolizione soletta	3 g	ven 12/05/23	mar 16/05/23	14																								
16	nuova soletta CA	5 g	mer 17/05/23	mar 23/05/23	15																								
17	nuova pavimentazione stradale	2 g	mer 24/05/23	gio 25/05/23	16																								
18	Fase 4	13 g	ven 26/05/23	mar 13/06/23																									
19	fresatura	3 g	ven 26/05/23	mar 30/05/23	17																								
20	demolizione soletta	3 g	mer 31/05/23	ven 02/06/23	19																								
21	nuova soletta CA	5 g	lun 05/06/23	ven 09/06/23	20																								
22	nuova pavimentazione stradale	2 g	lun 12/06/23	mar 13/06/23	21																								
23	Segnaletica Stradale	1 g	mer 14/06/23	mer 14/06/23	22																								
24	Smobilizzo	1 g	gio 15/06/23	gio 15/06/23	23																								

Progetto: 2020-11-12 SS675-SS3
Data: ven 16/12/22


Attività
Divisione

Avanzamento
Cardine

Riepilogo
Riepilogo progetto

Attività esterne
Cardine esterno

Scadenza

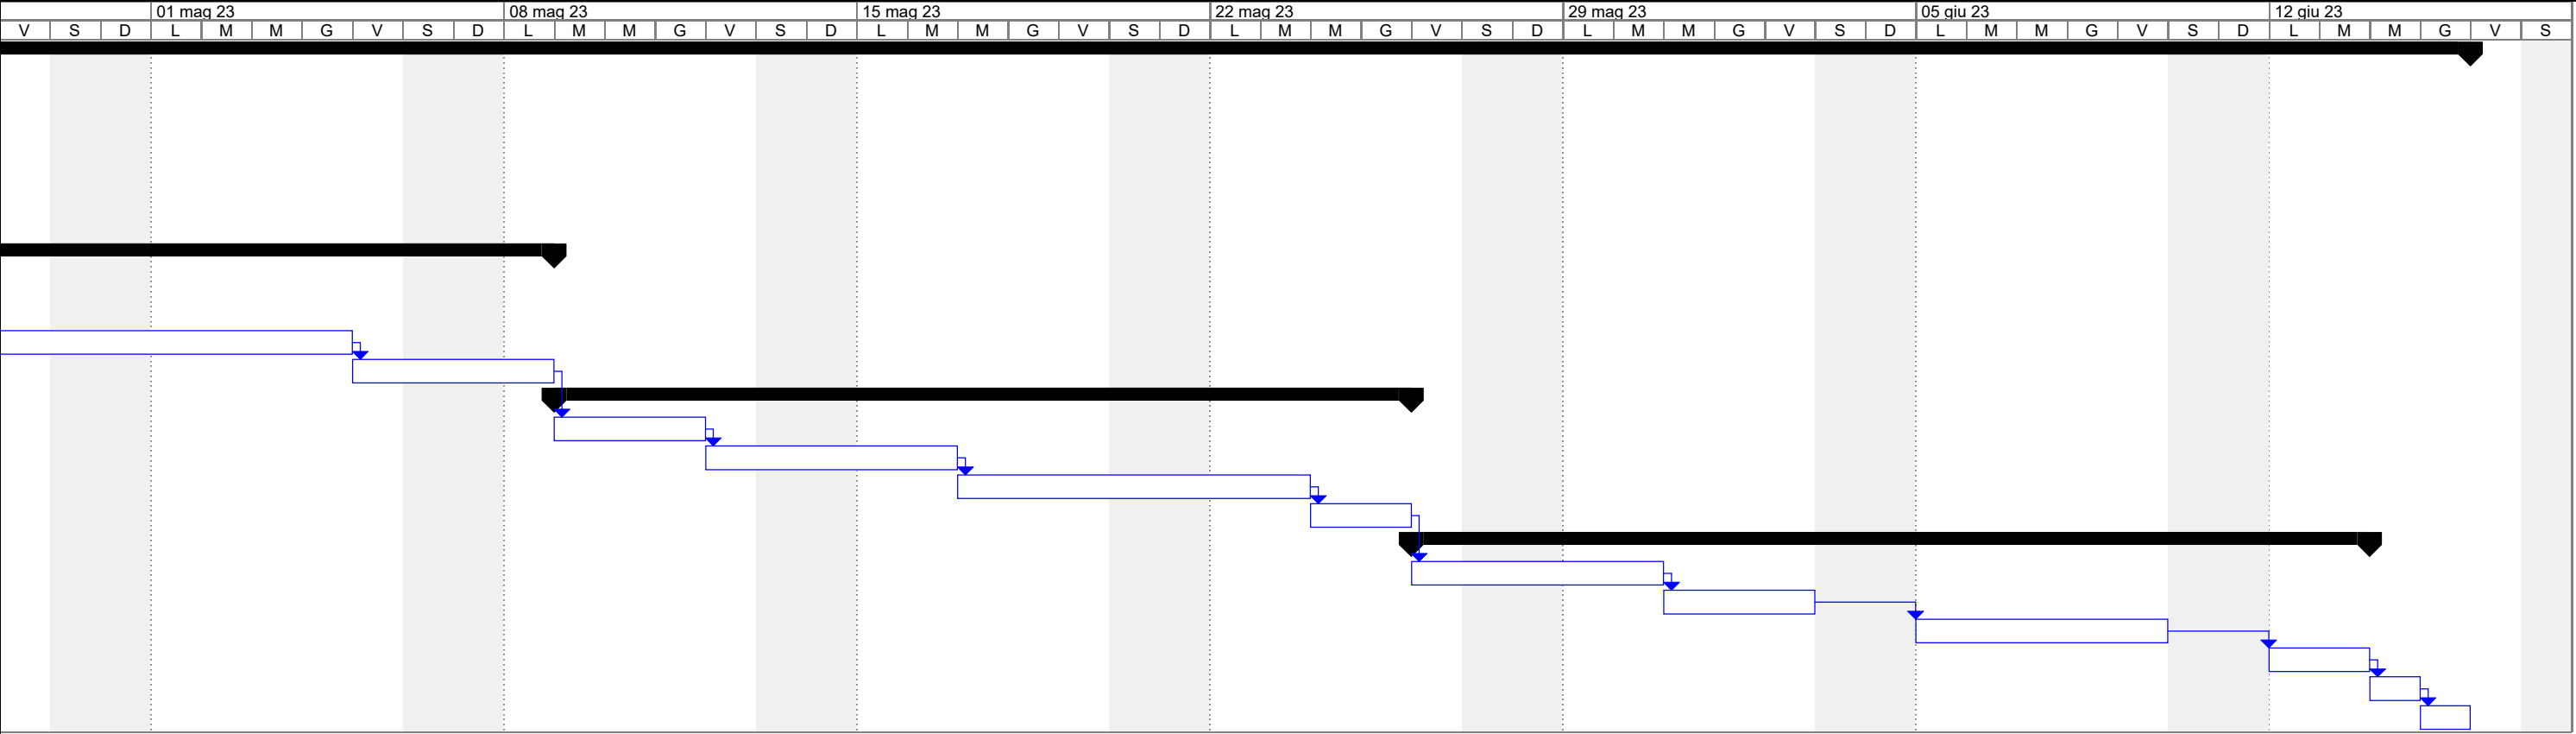

Progetto: 2020-11-12 SS675-SS3
Data: ven 16/12/22

Attività



Avanzamento



Riepilogo



Attività esterne



Scadenza



Divisione



Cardine



Riepilogo progetto



Cardine esterno

